



नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय



आ.व. २०७६।७७ को प्रगति विवरण

२०७७ श्रावण

शहरी विकास मन्त्रालय

१. शहरी विकास मन्त्रालयले मुख्यतया आवास (Housing), शहरी विकास (Urban Development) र भवन निर्माण (Building Construction) को ३ वटा क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । संविधान प्रदत्त आवासको मौलिकहक कार्यान्वयनका लागि जनता आवास (हाल प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको), सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि आवास व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
२. राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ पश्चात थप भएका नयाँ नगरपालिका सहित नगरपालिकाको संख्या २९३ पुगेसँगै शहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सोच पूरा गर्न आधुनिक पूर्वाधारयुक्त योजनाबद्ध वातावरणमैत्री विपद् प्रतिरोधी, व्यवस्थित, समावेशी, आर्थिक रूपमा गतिशील र सुरम्य शहर निर्माणका साथै शहर एवम् मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील एवम् दिगो बनाउन शहरी विकास कार्यक्रम, नयाँ शहर आयोजना, वागमती सुधार आयोजना, धोवीखोला सुधार आयोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, सुरक्षित नागरिक आवास जस्ता कार्यक्रमहरू संचालनमा रहेका छन् ।
३. भवन निर्माण तर्फ सरकारी कार्यालय भवन, विभिन्न सभाहल, सम्मेलन केन्द्र, विशेष प्रकृतिका भवनहरू (संघीय संसद भवन, दमक भ्यूटावर) निर्माण भइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न स्वास्थ्य भवनहरूको निर्माण कार्य समेत मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट भइरहेको छ ।
४. आ.व. २०७६/०७७ मा शहरी विकास मन्त्रालयको समग्र वित्तिय प्रगती तपशिल बमोजिम रहेको छ र बजेट उपशीर्षक बमोजिम वित्तिय प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची-१ मा दिइएको छ ।

आ.व. २०७६/०७७ को समग्र प्रगती (आ.व. को अन्तिममा कायम रहेको बजेटको आधारमा)

रु हजारमा

	चालु	पूँजिगत	जम्मा
विनियोजन	७,५०२,२९९.००	२७,९५०,९९९.००	३४,६५३,२९०.००
खर्च	४५९९०८६	१९९७२३१४	२४५७१४००
	६१.३०%	७३.५६%	७०.९१%
दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च ५५.७२%, पूँजिगत खर्च ४२.४६% र समग्र खर्च ४५.४७% रहेको थियो ।			

५. मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
 - **वागमती सुधार आयोजना:** वागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई फोहोरमुक्त बनाई अतिक्रमणबाट जोगाउन र वागमती सभ्यताको पुनर्स्थापनाको लागि वागमती नदी सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइएको र आ.व. २०७६/७७ मा वागमती सफाई अभियानको **३७५** औँ हप्ता सम्पन्न भएको छ । काठमाण्डौँ उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेका वागमती, मनोहरा, इच्छुमति, रुद्रमति, विष्णुमती, हनुमन्ते र नख्खुखोला लगाएतका नदीहरू ढल र प्रदुषणमुक्त बनाउन आ.व. २०७५/०७६ मा ८.० कि. मि. ढल, १.० कि.मी. सडकर ८ कि.मि. तटवन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ८.३३ कि. मि. ढल, १.८२ कि.मी. सडकर १३.०९ कि.मि. तटवन्ध निर्माण

सहित हालसम्म ८३.४९ कि.मी. ढल १८.२९ कि.मी. सडक र ५७.५० कि.मि. तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरि स्वच्छ वातावरण प्रबर्द्धन र सौन्दर्यीकरणको कार्य भइरहेको छ। वागमती नदीमा सुख्खायाममा समेत न्यूनतम् बहाव कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण शुरु गरिएको धाप ड्याम निर्माणको कार्य आ.व. २०७६/०७७ मा ३५% सम्पन्न भई हालसम्म समग्रमा ८०% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा ४३ वटा हरियाली पार्क निर्माण, सिनामङ्गलदेखि थापाथली पुलसम्म ४३८ सोलार बत्ती जडान भएको, साथै हनुमन्ते, नक्खु र बल्खु खोलामा तटबन्ध, ढल र सडक सुधारको कार्य एकीकृत रूपमा संचालन गरिएको छ। यसबाट वागमती नदीका काठमाडौं, ललितपुर, जोरपाटी, बौद्ध, मित्रपार्क, गुहेश्वरी, धोबीखोला, गोपीकृष्ण हल सम्मका स्थानीयवासी लाभान्वित भएका छन्।

- **मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना:** एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आ.व. २०६७/०६८ देखि शुरु भएको मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाबाट विराटनगर र विरगंजमा आ.व. २०७५/०७६ मा ४.०६ कि.मि. सतह नाली, ४.३९८ कि.मि. ढल र ७.७६९ कि.मि. सडक सुधार/निर्माण सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा २.७१ कि.मि. सतह नाली, ०.२४३ कि.मि. ढल र ०.७१ कि.मि. सडक सुधार/निर्माण सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाबाट आयोजना अवधीभर १२१ कि.मि. सतह नाली, ५१ कि.मि. ढल र ५२ कि.मि. सडक सुधार/निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सोही आयोजना मार्फत काभ्रे उपत्यकाका ३ वटा नगरपालिकामा संचालित करिब रु १ अर्ब लागतको एकीकृत खानेपानी आयोजनाको करिब ९०% कार्य सम्पन्न भएको छ भने आगामी २० वर्ष अवधीलाई धान्न सक्ने गरी वीरगंजमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
- **एकीकृत शहरी विकास आयोजना:** एसियाली विकास बैंक कै सहयोगमा आ.व. २०६९/०७० देखि शुरु भएको एकीकृत शहरी विकास आयोजना समेत आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाबाट सिदार्थनगर, नेपालगंज र जनकपुरमा आ.व. २०७५/०७६ मा ९.८६१ कि.मि. सतह नाली, ३.९८१ कि.मि. सडक सुधार/निर्माण सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ४३.९७७ कि.मि. सतह नाली र ०.७७ कि.मि. सडक सुधार/निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाबाट आयोजना अवधीभर १३५ कि.मि. सतह नाली र ३० कि.मि. सडक सुधार/निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा ४५० कि.मि. पाइपलाइन विस्तार सहित खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ भने आगामी २० वर्ष अवधीलाई धान्न सक्ने गरी नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको छ।
- **क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना:** एसियाली विकास बैंक कै सहयोगमा आ.व. २०७३/०७४ देखि शुरु भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाबाट विराटनगर, विरगंज, सिदार्थनगर र नेपालगंज न.पा. मा आ.व. २०७५/०७६ मा १५.८० कि.मि. सतह नाली, ९.७९ कि.मि. ढल र ७०.५० कि.मि. सडक सुधार/निर्माण सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ३३.०५ कि.मि. सतह नाली, ०.६४२ कि.मि. ढल र २५.०६ कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म १४४ कि.मि. सतह नाली, १८ कि.मि.

ढल र ११० कि.मि. सडक सुधार/निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदुर पश्चिम प्रदेशका चारवट नगरपालिकाहरू धनगढी, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्तमा करिव ५० कि.मि. शहरी सडक र नाला निर्माणका लागि खरिद सम्झौता भएको छ ।

- **एकीकृत कार्यमुलक योजना:** व्यवस्थित शहरी विकासलाई निर्देशित गर्न १८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको छ (१२ प्याकेज मध्ये ९ वटाको अन्तिम प्रतिवेदन र ३ वटाको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको)। १३ वटा नगरपालिका (भरतपुर, धनकुटा, निजगढ, मिर्चैया, चंद्रपुर, काभ्रे उपत्यका, पालुंगटार, वालिंग, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी, टिकापुर) हरुलाई Smart City को रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार भएको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक महत्वका बीरगञ्ज जीतपुर सिमरा पथलैया हेटौडा कोरिडोर सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने विराटनगर - दुहवी - इनरवा- इटहरी - धरान - दमक र वुटवल - भैरहवा - लुम्बिनी - कपिलवस्तु कोरोडोरहरूको DPR तयारीका लागि परामर्श सेवा लिने कार्य शुरु भएको छ । आ.व. २०७६/०७७ नै Trans Himalaya Trail मा पर्ने ५ नयाँ शहरहरूको (लुक्ला, स्याफ्रुवेसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडी) संभाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
- **सघन शहरी विकास कार्यक्रम:** सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २१ नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट आ.व. २०७५/०७६ सम्म सडक कालोपत्रे ३५० कि.मि., नाला २९१ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा कालोपत्रे सडक ११० कि.मि. र नाला निर्माण १६५ कि.मि. गरी हालसम्म कालोपत्रे सडक ४६० कि.मि. र नाला निर्माण ४५६ कि.मि. सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै आ.व. २०७५/०७६ सम्म बसपार्क २ वटा, हाटबजार ५ वटा, मनोरञ्जन पार्क ४ वटा र पोखरी २ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप २ वटा बसपार्क (सप्तरी र सिराहा) को ९०%, २ वटा हाट बजार (नवलपरासी र राजविराज) को ८०% र २ वटा ताल तथा पोखरी (धनुषा र महोत्तरी) को ९०% कार्य सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानेटरी ल्याण्ड फिल्ड साईट निर्माण कार्यको प्रथम चरणको ३९% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने दोश्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि खरिद सम्झौता भएको छ ।

- **नयाँ शहर आयोजना:** आ.व. २०७६/०७७ मा नयाँ शहर आयोजना तर्फ खुर्कोट, चौरजहारी, डुम्रेभन्सार, पाटन, फिदिम, बसन्तपुर, बुर्तिबाङ्ग, वैरेनीगल्छी, राकम कर्णाली र साँफेबगरमा ३० कि .मि.. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । फिदिम बस पार्क निर्माण कार्यको ११%, चौरजहारी बसपार्कको १६% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने मौलापुर बसपार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । प्युठानको भिग्री नयाँ सहरमा डिपिआर अनुसार मालुङफाँटमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने कार्य १४ % सम्पन्न भएको छ ।

- **धोबीखोला सुधार आयोजना:** धोबीखोला सुधार आयोजनाबाट गत आ.व. २०७५/०७६ मा कालो पुल देखि विमा समिति सम्म नदीको दुवै किनारमा ५ किमि. सडक कालोपत्रे सम्पन्न सडक निर्माण सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप १५ कि.मि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- **काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण:** शहरी सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाण्डौँ उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत) कार्य ३० कि.मी सम्पन्न भएको छ । काठमाण्डौँ उपत्यकाको चार स्थानमा नयाँ नगर निर्माणका लागि DPR तयार भएको छ ।
- **राष्ट्रिय भवन संहिता:** वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र यसले पुर्याएको क्षति समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय भवन संहिताका २३ भाग मध्ये ५ भागहरू समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ (NBC 105 स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको) भने थप २ भागहरू परिमार्जनका क्रममा रहेका छन् ।
- **विशेष भवन निर्माण आयोजना:** संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको ८%, प्रधानमन्त्री सरकारी आवास निर्माण कार्यको २५%, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कार्यको २१%, र मन्त्री आवासको निर्माण कार्यको २२% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राजकीय अतिथी गृह निर्माण कार्यको डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- **सभाहल र अन्य भवन निर्माण:** काठमाण्डौँको गोदावरीमा ३००० व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको ६५% कार्य सम्पन्न भएको छ । ५००० व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको Architectural Design सम्पन्न भएको Structural Design का साथै EIA भैरहेको छ । भरतपुर सभाहलको डिजाइन लागत अनुमान सम्पन्न भएको छ । दमक भ्यू टावरको १५% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने बुटवल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगाएत अन्य २६ वटा सभाहलहरू निर्माणाधीन रहेका छन् ।
- **आवास व्यवस्था कार्यक्रम:** संविधान प्रदत्त आवासको मौलिकहक कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७५/७६ सम्ममा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्गको लागि १७ हजार ३९ आवास एकाई निर्माण भएको छ भने करिब ३९ हजार आवास निर्माणका लागि आ .व.२०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारहरूलाई शसर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तरगत १६८२८१ लाभग्राही छनौट भएका छन् । छनौट भएकामध्ये २०७७ अषाढ मसान्त सम्म १४०१९ लाभग्राहीसंग अनुदान सम्झौता भएकोमा ८०५ आवास इकाईको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम स्थानीय तहमा नै पठाउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन, २०७६ संशोधन गरिएको छ ।

- **एकीकृत वस्ती विकास:** रसुवा र कास्कीका १-१ स्थानमा एकीकृत वस्ती विकासका लागि संभाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ भने ८ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकासका लागि संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिरोका कारण बिस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न डडेल्धुरामा जग्गा प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण (सडक, ढल) को कार्य आ.व. २०७५/०७६ बाट नै शुरु भएको छ भने सर्लाही र मुगुमा पूर्वाधार निर्माण कार्य आ.व. २०७६/०७७ सुरु भएको छ ।
 - **स्वास्थ्य भवन निर्माण:** नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दैजाने नीति अनुसार यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट स्वास्थ्य भवन निर्माण अन्तर्गत आ.व. २०७५।७६ सम्म देश भरमा १५०७ विभिन्न तहका स्वास्थ्य भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप २५९ भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने विभिन्न ३०३ वटा भवनहरू निर्माणाधीन रहेका छन् ।
६. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा आधारित लक्ष्य र प्रगती तपशिल बमोजिम रहेको छ।


विवरण	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य	प्रगती	
सडक निर्माण	कि.मि.	१३०	२१३.३६	
नाली निर्माण	कि.मि.	१६०	२५३.९५	ढल सहित
सुरक्षित नागरिक आवास	संख्या	१८९००	८०५	
जनता आवास	संख्या	३००००	प्रगती प्राप्त नभएको (प्रदेशबाट कार्यान्वयन भइरहेको)	
संघीय संसद भवन निर्माण	प्रतिशत	२०	८	
प्रधानमन्त्री आवास निर्माण	प्रतिशत	२५	२५	
मन्त्री आवास निर्माण	प्रतिशत	३०	२२	
प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीका लागि आवास निर्माण	प्रतिशत	३०	२१	
३००० व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण	प्रतिशत	१००	६५	
५००० व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण	प्रतिशत	५	डिजाइन भइरहेको	
अन्य सभाहल निर्माण - २६ वटा				
वञ्चरेडाँडा Landfill Site निर्माण				
Ist Phase	प्रतिशत	१००	३९	
Iind Phase	प्रतिशत	१०	५	खरिद सम्झौता
वागमती सुधार आयोजना- सडक निर्माण	कि.मि.	६	१.८२	

विवरण	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य	प्रगती	
वागमती सुधार आयोजना- ढल निर्माण	कि.मि.	५	८.३३	
वागमती सुधार आयोजना- नदी नियन्त्रण	कि.मि	६	१३.०९	
वागमती सुधार आयोजना- धाप ड्याम निर्माण	प्रतिशत	४०	४५	

शहरी विकास मन्त्रालय
आ.व. २०७६/०७७ को मासिक खर्च

क्र.सं.	आयोजना	खर्च रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१	श्रावण	१९९,७०७	०.५५
२	भाद्र	२,४४४,०६०	९.४५
	अशोज	५,१३४,७१९	१४.११
४	कार्तिक	६,५४७,९८३	१७.९८
५	मंसिर	७,७६९,०९१	२१.२४
६	पौष	१०,४५३,३१८	२८.५७
७	माघ	१३,३७०,०३९	३६.२८
८	फाल्गुण	१५,७५७,९२१	४२.६६
९	चैत्र	१६,९८७,८१४	४६.०२
१०	वैशाख	१७,५६३,७६७	४७.३९
११	जेष्ठ	१८,८११,७८६	५१.४४
१२	अषाढ	२४,५७,१४,००	७०.९१

चौमासिक लक्ष्य र सो को प्रगती तलको चार्टमा दिइएको छ ।

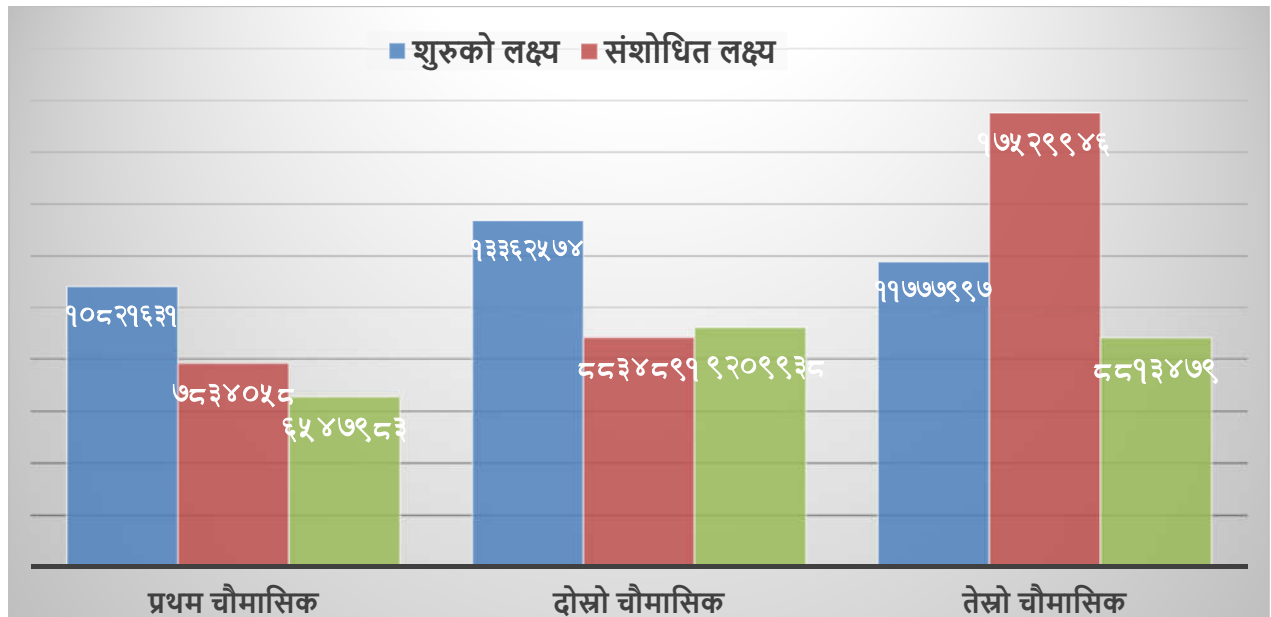

आ.व. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक (कार्तिक महिनासम्म) को खर्च विवरण

शहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. २०७६/०७७ को कार्तिक महिनासम्मको विनियोजन र खर्च

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन		रकमान्तर		कार्तिक महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूजिगत	चालु	पूजिगत	जम्मा	चालु	पूजिगत	जम्मा	
१	३४७०००११	शहरी विकास मन्त्रालय	१३४१००	८९००			१३४१००	८९००	१४३०००	२०८५२	१६१४	२२४६६	१५.७१%
२	३४७००१०१	बागमती सुधार आयोजना	१३७५००	४७५७२००			१३७५००	४७५७२००	४८९४७००	२५०४७	७७४६८८	७९९७३५	१६.३४%
	३४७०१०११	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	९१३००	०			९१३००	०	९१३००	२७२००		२७२००	२९.७९%
४	३४७०१०१२	संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय	१७५४००	३४२१००			१७५४००	३४२१००	५१७५००	२९६०४	१५९९६	४५६००	८.८१%
५	३४७०१०१३	संघीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरु	९६४००	२९०००			९६४००	२९०००	१२५४००	३०१०९	२७४८	३२८५७	२६.२०%
६	३४७०११०१	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	५९८७००	१३६०००			५९८७००	१३६०००	७३४७००	६६६	१७८०	२४४६	०.३३%
७	३४७०११०२	एकीकृत कार्यमूलक योजना (शहरी विकास)	५००	४०७९००			५००	४०७९००	४०८४००		१३९७५	१३९७५	३.४२%
८	३४७०११०३	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	७२७००	९१२२६००			७२७००	९१२२६००	९१९५३००	१०८१५	१६२४५५१	१६३५३६६	१७.७८%
९	३४७०११०४	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	३९६९००	०			३९६९००	०	३९६९००	२३६६६०		२३६६६०	५९.६३%
१०	३४७०११०५	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	८३९००	१९२६३००			८३९००	१९२६३००	२०१०२००	५७९४	४९९७४८	५०५५४२	२५.१५%
११	३४७०११०६	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ	२००	१९८००			२००	१९८००	२००००		५२४	५२४	२.६२%
१२	३४७०११०७	नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना	३३००	८६९००			३३००	८६९००	९०२००	१५०		१५०	०.१७%
१३	३४७०११०८	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	५९००	२२१००			५९००	२२१००	२८०००	७५८		७५८	२.७१%
१४	३४७०११०९	एकीकृत शहरी विकास आयोजना	३९९८००	७५००			३९९८००	७५००	४०७३००	२०७४३०	४४३५	२११८६५	५२.०२%
१५	३४७०१११०	नयाँ सहर आयोजना	१२४१००	१८५५६००			१२४१००	१८५५६००	१९७९७००	१४६९८	२०३२८२	२१७९८०	११.०१%
१६	३४७०११११	क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम	५०८५६००	२८६३०००			५०८५६००	२८६३०००	७९४८६००	१९२४८८७	३३१३९	१९५८०२६	२४.६३%
१७	३४७०१११४	एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम	०	५०००००			०	५०००००	५०००००		२९०५	२९०५	०.५८%
१८	३४७०१११७	विशेष भवन निर्माण आयोजना	१०१००	५०१७९००			१०१००	५०१७९००	५०२८०००	३४१	५७९७८९	५८०१३०	११.५४%

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन		रकमान्तर		कार्तिक महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१९	३४७५११०१	नगर विकास कोष	४६००००	०			४६००००	०	४६००००	२२०००		२२०००	४.७८%
२०	३४७७११०१	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	८४०००	१०३३९००		८२५०	८४०००	१०४२१५०	११२६१५०	२८६१६	१५३६२६	१८२२४२	१६.१८%
२१	३४७७११०२	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	५२००	३१५३००			५२००	३१५३००	३२०५००	१४४१	४८११५	४९५५६	१५.४६%
		जम्मा	७९६५६००	२८४५२०००	०	८२५०	७९६५६००	२८४६०२५०	३६४२५८५०	२५८७०६८	३९६०९१५	६५४७९८३	१७.९८%

आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक (फाल्गुण महिनासम्म) को खर्च विवरण

शहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. २०७६/०७७ को फाल्गुण महिनासम्मको विनियोजन र खर्च

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन		रकमान्तर		फाल्गुण महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१	३४७०००११	शहरी विकास मन्त्रालय	१३४१००	८९००			१३४१००	८९००	१४३०००	४१६१२	३२५७	४४८६९	३१.३८%
२	३४७००१०१	बागमती सुधार आयोजना	१३७५००	४७५७२००			१३७५००	४७५७२००	४८९४७००	६४३२६	२१३१४१२	२१९५७३८	४४.८६%
	३४७०१०११	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	९१३००	०			९१३००	०	९१३००	५३४३८		५३४३८	५८.५३%
४	३४७०१०१२	संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय	१७५४००	३४२१००	४३१४	७८८९७	१७९७१४	४२०९९७	६००७११	६७६१२	८०९५५	१४८५६७	२४.७३%
५	३४७०१०१३	संघिय सहरि विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरु	९६४००	२९०००			९६४००	२९०००	१२५४००	५४३११	९४७६	६३७८७	५०.८७%
६	३४७०११०१	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	५९८७००	१३६०००			५९८७००	१३६०००	७३४७००	७३०९५	१६३६२	८९४५७	१२.१८%
७	३४७०११०२	एकीकृत कार्यमूलक योजना (शहरी विकास)	५००	४०७९००			५००	४०७९००	४०८४००		१५९२४४	१५९२४४	३८.९९%
८	३४७०११०३	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	७२७००	९१२२६००		२६००००	७२७००	९३८२६००	९४५५३००	२७३६८	४९३१५८९	४९५८९५७	५२.४५%
९	३४७०११०४	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	३९६९००	०	१६५६००		५६२५००	०	५६२५००	४२८७१०		४२८७१०	७६.२२%
१०	३४७०११०५	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	८३९००	१९२६३००	१२५००	४९००००	९६४००	२४१६३००	२५१२७००	१४१९६	१२६०३१६	१२७४५१२	५०.७२%
११	३४७०११०६	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ	२००	१९८००			२००	१९८००	२००००		८०४	८०४	४.०२%
१२	३४७०११०७	नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना	३३००	८६९००			३३००	८६९००	९०२००	७४७	१०३२५	११०७२	१२.२७%
१३	३४७०११०८	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	५९००	२२१००	५३०९५	९०७००	५८९९५	११२८००	१७१७९५	४९६७	४१४५	९११२	५.३०%
१४	३४७०११०९	एकीकृत शहरी विकास आयोजना	३९९८००	७५००	१४६१०४		५४५९०४	७५००	५५३४०४	४२५९२७	७२६६	४३३१९३	७८.२८%
१५	३४७०१११०	नयाँ सहर आयोजना	१२४१००	१८५५६००		२५००००	१२४१००	२१०५६००	२२२९७००	३७५८८	६८०२७८	७१७८६६	३२.२०%

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन		रकमान्तर		फाल्गुण महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजिगत	चालु	पूँजिगत	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१६	३४७०११११	क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम	५०८५६००	२८६३०००	३११७०४	-	४७७३८९६	२८६३०००	७६३६८९६	२८०५६३२	९०१४९	२८९५७८१	३७.९२%
१७	३४७०१११४	एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम	०	५०००००			०	५०००००	५०००००		२२८०८	२२८०८	४.५६%
१८	३४७०१११७	विशेष भवन निर्माण आयोजना	१०१००	५०१७९००		-९९००००	१०१००	४०२७९००	४०३८०००	१३६५	१४२८२२०	१४२९५८५	३५.४०%
१९	३४७५११०१	नगर विकास कोष	४६००००	०			४६००००	०	४६००००	२२०००		२२०००	४.७८%
२०	३४७७११०१	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	८४०००	१०३३९००		२६८२५०	८४०००	१३०२१५०	१३८६१५०	५४२८२	६३२४४७	६८६७२९	४९.५४%
२१	३४७७११०२	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	५२००	३१५३००			५२००	३१५३००	३२०५००	२८७४	१०८८१८	१११६९२	३४.८५%
		जम्मा	७९६५६००	२८४५२०००	६९९०९	४४७८४७	८०३५५०९	२८८९९८४७	३६९३५३५६	४१८००५०	११५७७८७१	१५७५७९२१	४२.६६%

शहरी विकास मन्त्रालय
आ.व. २०७६/०७७ को अषाढ महिनासम्मको विनियोजन र खर्च

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन			रकमान्तर		अषाढ महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजीगत	कुल जम्मा	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१	३४७०००११	शहरी विकास मन्त्रालय	७२७००	९१२२६००	९,१९५,३००		१५२६६६	७२७००	९२७५२६६	९३४७९६६	४९४८०	८१५३८१०	८२०३२९०	८७.७५%
२	३४७००१०१	बागमती सुधार आयोजना	३९६९००	०	३९६,९००	२५६५५०	१५००००	६५३४५०	१५००००	८०३४५०	५७३८०२		५७३८०२	७१.४२%
	३४७०१०११	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	८३९००	१९२६३००	२,०१०,२००		३०१५००	८३९००	२२२७८००	२३११७००	२९६०१	१९७६८५०	२००६४५१	८६.८०%
४	३४७०१०१२	संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय	२००	१९८००	२०,०००			२००	१९८००	२००००		२८८४	२८८४	१४.४२%
५	३४७०१०१३	संघिय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरू	३३००	८६९००	९०,२००			३३००	८६९००	९०२००	१३२९	५३६६५	५४९९४	६०.९७%
६	३४७०११०१	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	५९००	२२१००	२८,०००	५३०९५	९०७००	५८९९५	११२८००	१७१७९५	७९६४	५९३९	१३९०३	८.०९%
७	३४७०११०२	एकीकृत कार्यमूलक योजना (शहरी विकास)	३९९८००	७५००	४०७,३००	१७५२७१		५७५०७१	७५००	५८२५७१	४१०६९३	७२६६	४१७९५९	७१.७४%
८	३४७०११०३	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	७२७००	९१२२६००	९,१९५,३००		१५२६६६	७२७००	९२७५२६६	९३४७९६६	४९४८०	८१५३८१०	८२०३२९०	८७.७५%
९	३४७०११०४	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	३९६९००	०	३९६,९००	२५६५५०	१५००००	६५३४५०	१५००००	८०३४५०	५७३८०२		५७३८०२	७१.४२%
१०	३४७०११०५	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	८३९००	१९२६३००	२,०१०,२००		३०१५००	८३९००	२२२७८००	२३११७००	२९६०१	१९७६८५०	२००६४५१	८६.८०%
११	३४७०११०६	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ	२००	१९८००	२०,०००			२००	१९८००	२००००		२८८४	२८८४	१४.४२%
१२	३४७०११०७	नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना	३३००	८६९००	९०,२००			३३००	८६९००	९०२००	१३२९	५३६६५	५४९९४	६०.९७%
१३	३४७०११०८	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	५९००	२२१००	२८,०००	५३०९५	९०७००	५८९९५	११२८००	१७१७९५	७९६४	५९३९	१३९०३	८.०९%
१४	३४७०११०९	एकीकृत शहरी विकास आयोजना	३९९८००	७५००	४०७,३००	१७५२७१		५७५०७१	७५००	५८२५७१	४१०६९३	७२६६	४१७९५९	७१.७४%

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	आयोजना	शुरु विनियोजन			रकमान्तर		अषाढ महिनासम्म कायम रहेको			खर्च			
			चालु	पूँजीगत	कुल जम्मा	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१५	३४७०१११०	नयाँ सहर आयोजना	१२४१००	१८५५६००	१,९७९,७००		-१५००००	१२४१००	१७०५६००	१८२९७००	६०१६९	१४३६५२६	१४९६६९५	८१.८०%
१६	३४७०११११	क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम	५०८५६००	२८६३०००	७,९४८,६००	-४३१८२१	-४१९५५६	४६५३७७९	२४४३४४४	७०९७२२३	२५७८१०९	२९४४७२	२८७२५८१	४०.४७%
१७	३४७०१११४	एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम	०	५०००००	५००,०००		-२९८९४८	०	२०१०५२	२०१०५२		१३५०१८	१३५०१८	६७.१६%
१८	३४७०१११७	विशेष भवन निर्माण आयोजना	१०१००	५०१७९,००	५,०२८,०००		-२०८८१९३	१०१००	२९२९७०७	२९३९८०७	३५३९	२१०८८३४	२११२३७३	७१.८५%
१९	३४७५११०१	नगर विकास कोष	४६००००	०	४६०,०००			४६००००	०	४६००००	२१५९३७		२१५९३७	४६.९४%
२०	३४७७११०१	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	८४०००	१०३३९,००	१,११७,९००	१२६०९	७२०६५८	९६६०९	१७५४५५८	१८५११६७	८२१४१	१५२०८४०	१६०२९८१	८६.५९%
२१	३४७७११०२	धोत्रिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	५२००	३१५३००	३२०,५००			५२००	३१५३००	३२०५००	४७४०	२७२८०६	२७७५४६	८६.६०%
		जम्मा	७९६५६००	२८४५२०००	३६,४१७,६००	-४६३३०१	-१३०१००९	७५०२२९९	२७५५०९९१	३४६५३२९०	४५९९०८६	१९९७२३१४	२४५७१४००	७०.९१%
